

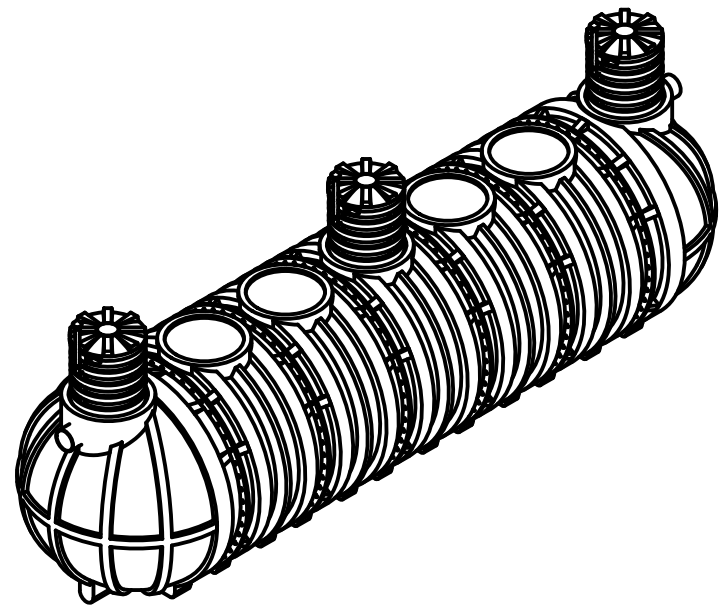
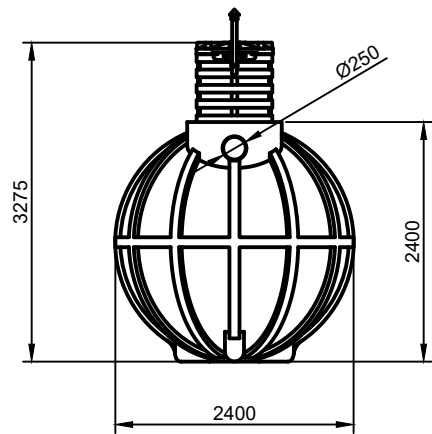
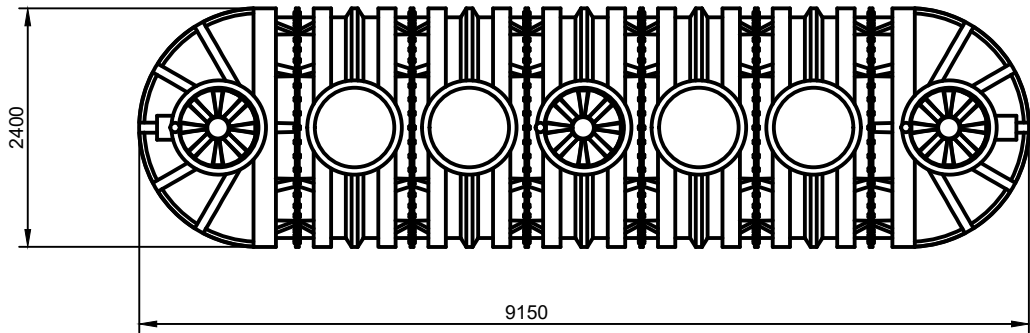
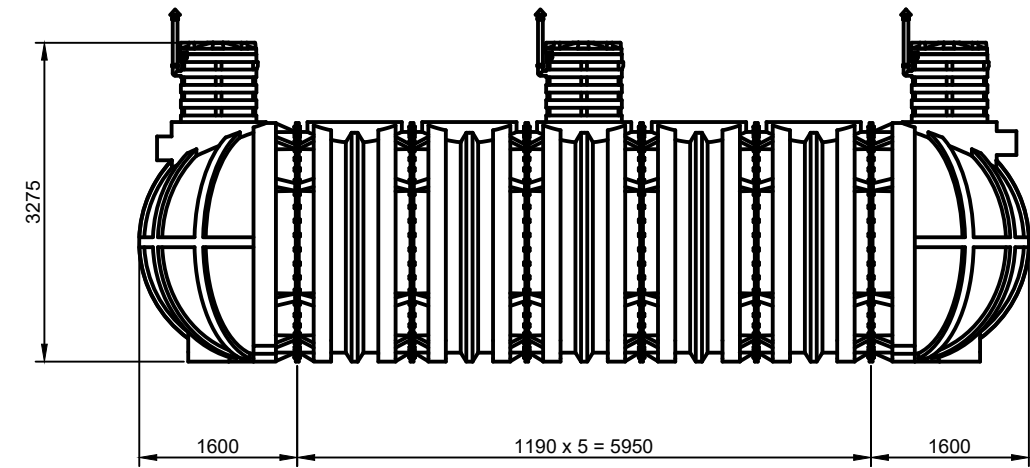
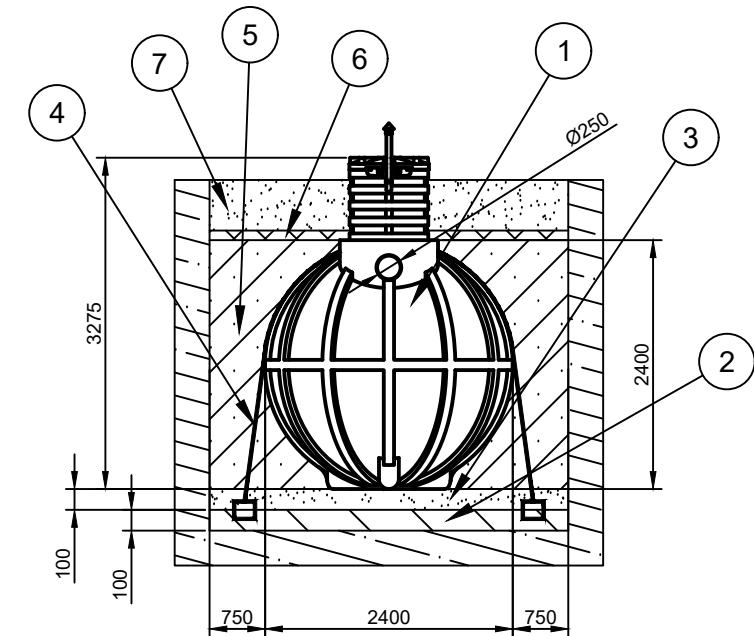


Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	

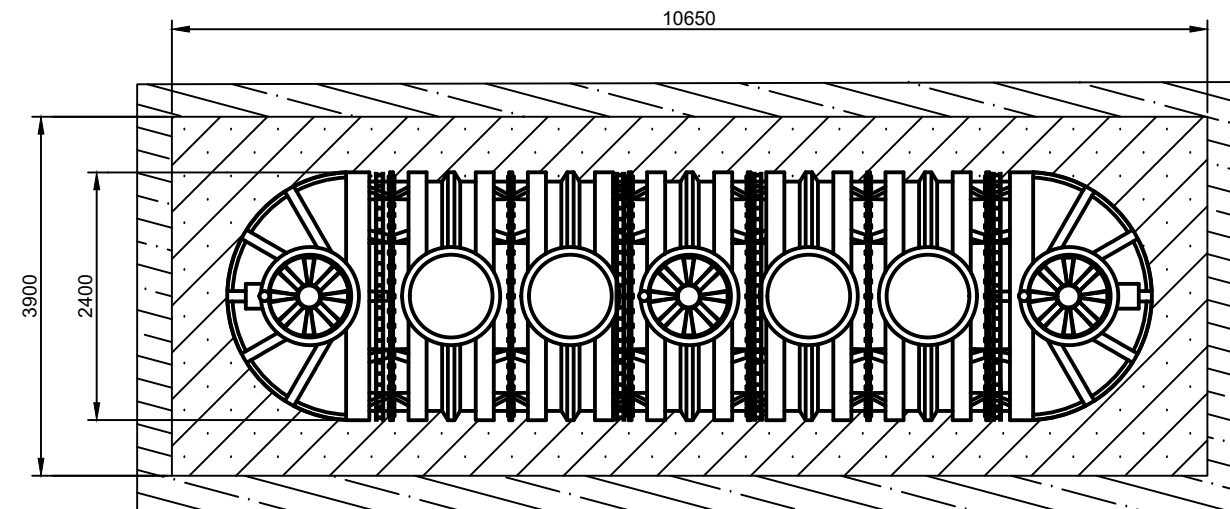

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ЛОС М35	Лит.		Масса	Масштаб		
Разраб.											
Пров.											
Т.контр.						Лист		Листов			
Н.контр.											
Утв.											

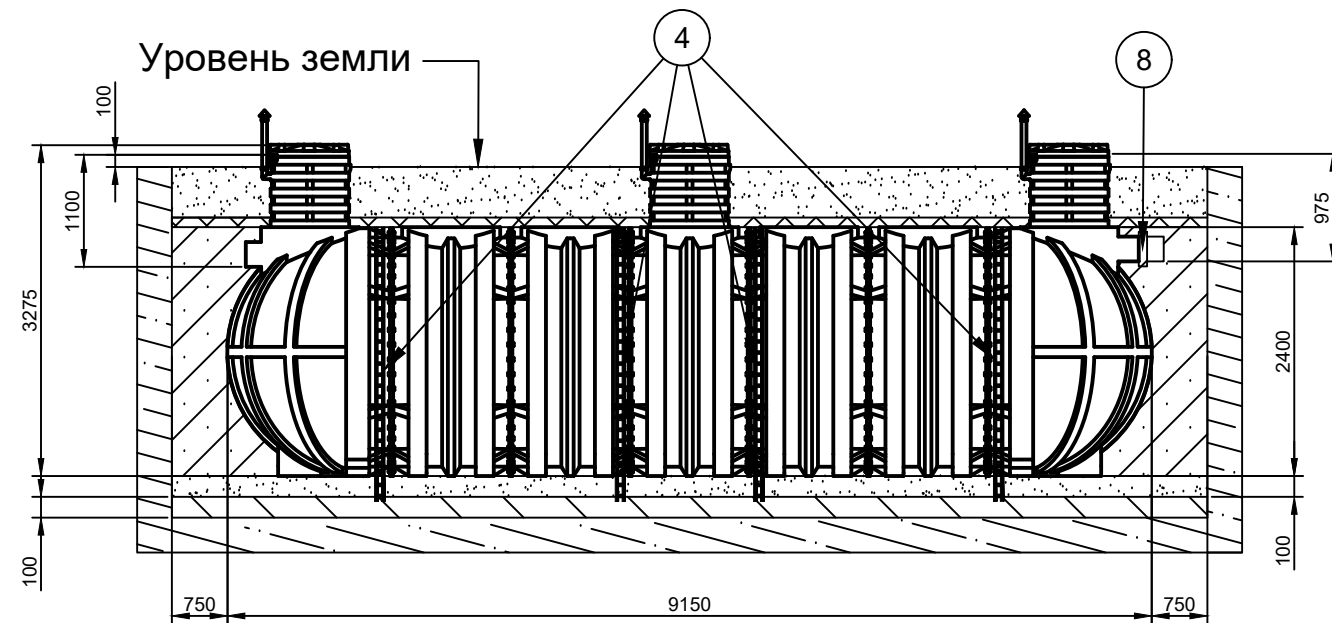

Спецификация материалов:

- Габаритные размеры котлована под модуль (минимальные):
Длина - 10650 мм
Ширина - 3900 мм
Глубина - 3250 мм
- Вход для подводящей трубопроводной трассы - труба 250 мм.
- Песок - не менее 58 м3
- Цемент - не менее 11.6 м3
- Вода (для заполнения емкости) - не менее 35 м3

- Строительные и монтажные работы производить согласно своду правил СП 48.13330.2011 "Организация строительства".
- Модуль монтируется под землю. Минимальное расстояние от края горловины (без крышки) до уровня земли должно составлять не менее 100 мм.
- Расстояние от края модуль до края котлована должно быть не менее 750 мм.
- Монтаж модуля производится на песчаную подушку толщиной не менее 100 мм.
- Модуль утепляется по верхней части корпуса. Толщина утеплителя не менее 30 мм.
- Обратная засыпка производится цементно-песчаной смесью (ЦПС) послойно (300 мм) с соотношением 1:5 (цемент:песок), с одновременной трамбовкой каждого слоя и заполнением модуля водой с целью выравнивания внутреннего и наружного давлений. При работе использовать цемент марки М500.
- Модуль фиксируется на железобетонной плите толщиной не менее 100 мм с применением синтетических строп.
- В случае пьвуна, грунта типа торф, обрушения стенок котлована необходим монтаж опалубки из досок сечением 150х50 мм.

Наименование

	Наименование
1	Модуль
2	Ж-Б плита
3	Песч-я подушка
4	Строп
5	ЦПС
6	Изоляция
7	Засыпка
8	Муфта

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата

Монтажная схема ЛОС М35

Лист
2
